


कपिलवस्तु नगरपालिका कार्यालय

वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी

मिति २०७३/०५/२०

नगर परिचय:

Kapilvastu Municipality
Base Map

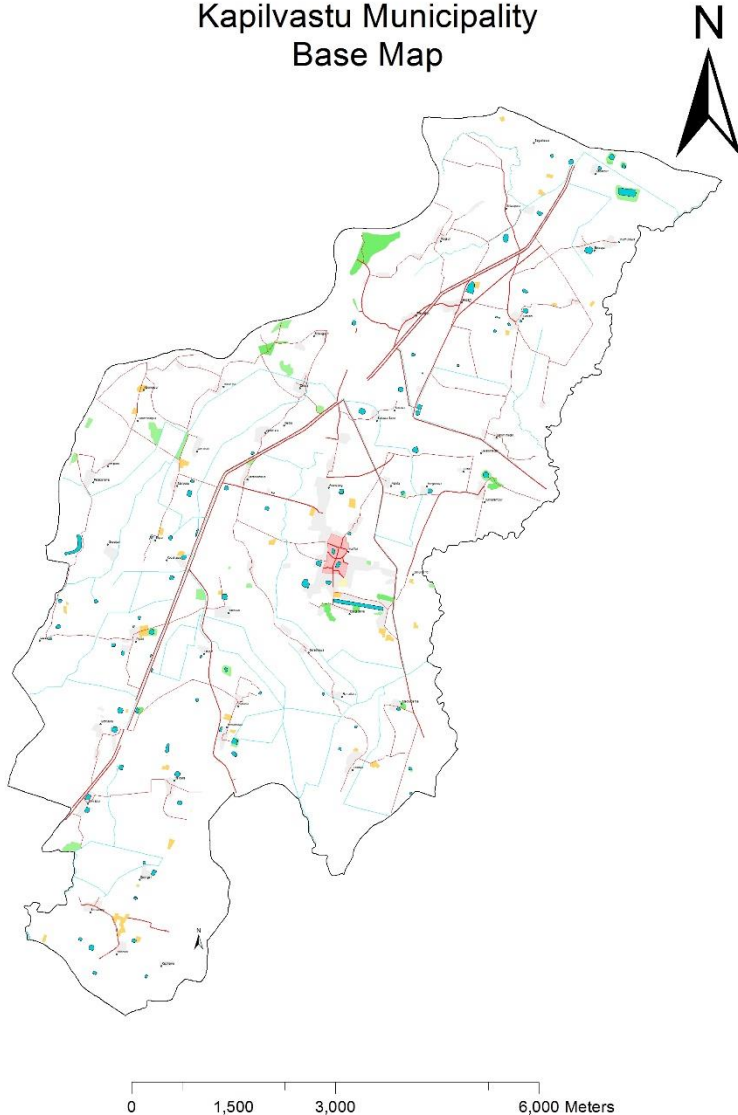

Ward Level Map of
Kapilvastu Municipality



परिचय

- स्थापना २०३९
- क्षेत्रफल ६३.६१ वर्ग
- वडासंख्या १९
- जनसंख्या ४३४७१ (२०६८)
- घरधुरी ७१२९ (२०६८)
- घरधुरी ६४९७ (२०७१)
- शौचालय भएके ३४९७
- शौचालय नभएके ३०००
- खानेपानीका पहुंच ९५ प्रतिशत

परिचय क्रमश यातायातके अवस्था

- कच्ची सडक ४१.९४ कि.मि
- ग्रेभल सडक ४२.२ कि.मि
- कालेपत्रे सडक ३८.९३ कि.मि
- ढल निकास ९४६५ मिटर

प्रमुख उपलब्धिहरू

- समुदायमा आधारित फोहोर मैला व्यवस्थापन , फोहोर मैला व्यवस्थापनमा युवा परिचालन, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा दण्ड जरिवाना तथा नियमित अनुगमनको व्यवस्था,
- बार्षिक कार्यक्रमको अतिरिक्त TDF संग सम्झौता गरि ऋण तथा अनुगमनमा सौर्य उर्जामा आधारित सडक बत्ति जडान कार्य सुरु गरिएको
- सहरी हरियाली तथा सौन्दर्य अभिवृद्धिको लागि नगर क्षेत्र भित्र दुई वटा पार्क निर्माण गरिएको
- न. पा. मा थप भएका दुई वटा गा बि स मा एकिकृत सम्पत्ति कर लागू गरिएको
- नगर क्षेत्रको ढल व्यवस्थापनको लागि मास्टर प्लान तयारी भइ रहेको, ODF घोसणाको लागि नगरपालिका स्तरीय अनुगमन समिति बनाई सौचालय निर्माण अभियानलाई तिब्र बनाइएको

प्रमुख सिकाईहरू

- जन सहभागीमा संचालन हुने क्रियाकलापहरूमा अर्थपूर्ण जन सहभागिताको लागि नगर बासिको क्षमता विकास तथा सचेतना अभि वृद्धि गर्न जरुरि देखिएको
- उपभोक्ता समिति बाट हुने विकास निर्माणका काम हरुमा गुणस्तरियता कायम हुन नसकेको, ठेकेदारी प्रवृत्ति हाबी भएको, नियन्त्रण गर्न कठिन भएको
- नगर क्षेत्र भित्र संचालन गरिने विकास निर्माणका कार्य हरु प्लानको आधारमा नगई वर्तमानको माग र आवश्यकताको आधारमा हदा विकास निर्माण कार्य अव्यवस्थित हुने गरेको र भोलिको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको
- जनतालाई प्रधान गरिने सेवा सुबिधा छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन ज्ञान र शिपमा आधारित दक्ष जनशक्तिको निर्माण र नबिन प्रबिधिमा जोड दिनु पर्ने देखिएको

बार्षिक वित्तीय प्रगति

वार्षिक आय व्यय विवरण

क)

विवरण	चालु		पूजिगत		कुल	
	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च
केन्द्रिय अनुदान	११६३२	११४४७	३८९४९	३४६४४	५०५८१	४६०९१
राजश्व बांडफांड			१०६००	१३११	१०६००	१३११
आन्तरीक आय	५९५२	५६३४	४०४८	४०४८	१००००	९६८२
अन्य	१७९९९	१८६४९	१९८२४	१६८९३	३७८२३	३५५४२
कुल	३५५८३	३५७३०	७३४२१	५६८९६	१०९००४	९२६२६

ख)

शीर्षक	कुल बजेट
जिम्मेवारी सारेको रकम	८८९८

आन्तरिक आय तथा राजश्व बाँडफाँडको अवस्था

विवरण	०७२/७३ को कूल अनुमानित आय (रु हजारमा)	यथार्थ आम्दानी (रु हजारमा)	प्रगति (%)
आन्तरिक आय	१००००	८७१४	८७.१४
राजश्व बाँडफाँड	१०६००	३९९३	३७.६६
कूल जम्मा	२०६००	१२७०७	६१.६८

आन्तरिक आय तथा राजश्व बाँडफाँडको अवस्था

राजश्व बाँडफाँड शीर्षकगत आम्दानी (रकम रु. हजारमा)

राजश्व शीर्षक	रकम
१. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन बाट प्राप्त	३५३८
२. विध्युत रोयल्टी बाट प्राप्त	०
३. पर्यटन / पर्वतारोहण बाट प्राप्त	०
४. बन रोयल्टी बाट प्राप्त	०
५. अन्य	४५४

लक्षित वर्ग तथा समावेशीकरण सम्बन्धि (रकम रु. हजारमा)

विवरण	संचालित कार्यक्रम संख्या	विनियोजित रकम	खर्च रकम
१) बालबालिका तर्फ	२१	२०२५	१७१९
२) महिला तर्फ	१६	२०४३	१९०९
३) अन्य लक्षित वर्ग तर्फ			
क) अपाङ्ग तर्फ	३	१००	१००
ख) पिछडिएको वर्ग	२०	२९३२	२९२१
ग) आदिवासी जनजाति तर्फ	०	०	०
घ) दलित तर्फ	०	०	०
ङ) जेष्ठ नागरीक तर्फ	१	१०५	१०४
च) मधेसी	०	०	०
छ) मुस्लिम	३	१००	१००
ज) अन्य			

भौतिक प्रगति

क्र.स	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
१	सडक	माटे /कच्ची सडक	कि.मी.	४०.७८	१.५	१.१६	
		ग्राभेल सडक	कि.मी.	३९.९५	२.२५	२.२५	
		कालो पत्रे सडक	कि.मी.	३७.४६	१.४७	१.४७	
		सडक कल्भर्ट	वटा		१	१	
२	खानेपानी	खानेपानी योजना	संख्या		३७	३७	
३	सिंचाई	नहर, कुलो	कि.मी.				२१० हेक्टर सिंचित क्षेत्र
		पोखरी	वटा				
४	सडकपुल निर्माण सम्पन्न	पुल	वटा				
५	फोहोरमैला	स्यानिटरी ल्याण्ड फिल्ड साइट	वटा				
		ढल निकास	मिटर	८२५०	१२१५	१२१५	

भौतिक प्रगति

	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
५	आवास तथा भवन	विध्यालय भवन निर्माण	वटा		४	४	
		न.पा./वडा कार्यालय भवन निर्माण	वटा		१	१	
		वर्धिङ सेन्टर	वटा				
		स्वास्थ्य / उप स्वास्थ्य चौकी	वटा				
७	ऊर्जा एवं विध्युतीकर ण	सौर्य सडक वत्ती (ऊर्जा)	कि.वा				
		अन्य सौर्य उर्जा	कि.वा				
		जलविध्युत्	कि.वा				

भौतिक प्रगति

प्रवधनात्मक क्षेत्र कार्यक्रम

२०७३ आषाढ मसान्त सम्मको प्रगती विवरण

क्र. सं.	योजनाको नाम	बडा नं.	लागत अनुमान	श्रोत			मुल्याङ्कन	भौतिक लक्ष	भौतिक प्रगति %
				नगरपालिका बाट	उपभोक्ता समिति बाट	जम्मा			
१	मदरसा निर्माण तथा मर्मत सम्भार (नैमुलउलम मदरसा मस्जिद टोल)	१	६२,२९०६२	४०,०००१००	१२,२९०६२	६२,२९०६२	६२,२९०६२	१ गोटा	१००
२	स्लोपिङ्ग नाली निर्माण, राजपुर (माधुरी रैवासको घर देखि मुल नाली सम्म)	१	१३५,१२६।७९	११०,०००।००	२५,१२६।७९	१३५,१२६।७९	१३५,१२६।७९	२६ मी.	१००
३	सडक पि. सि. सि. (राधेश्याम कान्दुको घर देखि शैलेन्द्र गिरीको पछाडी)	२	६२,२१५।९०	४०,०००।००	१२,२१५।९०	६२,२१५।९०	६२,२१५।९०	१७ मीटर	१००
४	ईनार मर्मत तथा सडक पि. सि. सि. (लक्ष्मीनारायण मन्दिर अगाडी)	३	२५,०००।००	२०,०००।००	५,०००।००	२५,०००।००	२५,०००।००	१२ मिटर	१००
५	पक्की नाली निर्माण (जमुवारटोल आशुतोष घर अगाडी)	३	७१,६६६।०४	६०,०००।००	११,६६६।०४	७१,६६६।०४	७१,६६६।०४	१५ मिटर	१००
६	नाली मर्मत तथा सडक पि. सि. सि. कालिकाटोल	३	४०,२२०।१५	३०,०००।००	१०,२२०।१५	४०,२२०।१५	४०,२२०।१५	१३ मी.	१००
७	सडक मर्मत गर्ने काम (बुद्ध ज्योती उच्च मा. वि. देखि कृषि विकास बैक रोड सम्म)	४	९०,९२७६।५	७०,०००।००	२०,९२७६।५	९०,९२७६।५	९०,९२७६।५	१२० मी.	१००
८	नाली निर्माण स्लोप नाली रेवती फन्धीको घर देखि डार प्रसादको घर सम्म)	४	७२,०७७३।५	६०,०००।००	१२,०७७३।५	७२,०७७३।५	७०,९९५।४५	४६ मी.	१००

भौतिक प्रगति

९	सडक ईटा सोलिङ, (मोछु कुर्मीको घर देखि सागरतालको छेउ सम्म)	५	६१,९४७२१	५०,०००००	११,९४७२१	६१,९४७२१	६१,९४७२१	२४ मी.	१००
१०	सडक ईटा सोलिङ, (मखन धावीको घर देखि चन्द्रपाल यादवको घर सम्म)	५	६१,०००१९३	५०,०००००	११,०००१९३	६१,०००१९३	६१,०००१९३	१९ मी.	१००
११	बाल विकास भवन प्लास्टर तथा मर्मत (श्री शुक्रराज प्रा. वि. महुवरिया)	६	५३,३०४१०	४०,०००००	१३,३०४१०	५३,३०४१०	५३,३०४१०	१ वटा	१००
१२	विश्वालयको गेट निर्माण (श्री शुक्रराज प्रा. वि. महुवरिया)	६	२५,१७६१००	२०,०००००	५,१७६१००	२५,१७६१००	२५,१७६१००	१ वटा	१००
१३	मदरसा भवन मर्मत (लम्तिया गाउँको)	६	६०,०००००	५०,०००००	१०,०००००	६०,०००००	६०,०००००	१ गोटा	१००
१४	सडक ईटा सोलिङ (लम्तिया मुल सडक देखि अर्पती कुर्मी र राममणी कुर्मीको घर सम्म)	६	१,२५,१२१२४	१००,०००००	२५,१२१२४	१,२५,१२१२४	१,२५,१२६४९	३२ मिटर	१००
१५	मदरसा शौचालय निर्माण (अरदहवा मिसवाहुल मदरसा)	७	५४,७९३६४	४०,०००००	१४,७९३६४	५४,७९३६४	५४,७९३६४	१ गोटा	१००
१६	पक्की नाली निर्माण (अरदहवा धनईको घर देखि कल्लु कहारको घर सम्म)	७	१००,०३०५४	०,०००००	१००,०३०५४	१००,०३०५४	१००,०३०५४	४३ मी.	१००
१७	माटो पट्टान तथा ग्रेभल सागरटोल दुर्गा मन्दिर देखि सुदामा बढईको घर सम्म	७	२५,०००००	२०,०००००	५,०००००	२५,०००००	२०,०००००	२७ मी.	१००
१८	सडक ईटा सोलिङ (सेमरहवा निरहुको घर देखि सिचाई नहर सम्म)	=	६२,०००१६९	५०,०००००	१२,०००१६९	६२,०००१६९	६२,०००१६९	१६ मी.	१००
१९	सडक ईटा सोलिङ (सेमरहवा माने यादवको घर देखि बरसातु कोरीको घर सम्म)	=	६२,६००१०९	५०,०००००	१२,६००१०९	६२,६००१०९	६२,६००१०९	२१ मी.	१००

भौतिक प्रगति

२१	सामुदायिक भवन मर्मत सम्भार (महुवा पोखरीको भिटमा रहेको भवन)	९	९२,१=४३२	७५,०००।००	१७,१=४३२	९२,१=४३२	९२,१=४३२	१ वटा	१००
२२	सडक ईन्डा सोलिङ (दुलो सिकोटवा अर्जुन बढईको घर देखि तारा प्र. मिश्रको घर सम्म)	१०	६३,६२०।५०	५०,०००।००	१३,६२०।५०	६३,६२०।५०	६३,६२०।५०	१६.५ मीटर	१०००
२३	सडक मर्मत तथा ग्रेभल (सानो सिकोटवा गाउँमा)	१०	६०,०२=१५३	४५,०००।००	१५,०२=१५३	६०,०२=१५३	५२,९७१।७६	३० मी.	१००
२४	पक्की नाली निर्माण (दुलो सडकवा गाउँमा)	१०	६२,०३०।१७	५०,०००।००	१२,०३०।१७	६२,०३०।१७	६२,०३०।१७	२० मीटर	१००
२५	सामुदायिक भवन मर्मत सम्भार (सुखरामपुर गाउँको भवन)	११	९१,=११।२०	७५,०००।००	१६,=११।२०	९१,=११।२०	९१,=११।२०	१ वटा	१००
२६	सडक ईन्डा सोलिङ (लक्ष्मीनगर गाउँमा)	११	१,२४,६४६।४९	१००,०००।००	२४,६४६।४९	१,२४,६४६।४९	१,२४,६४६।४९	३२ मीटर	१००
२७	बाल विकासको लागि फर्निचर व्यवस्थापन (श्री सद्धार्थ गुम्बा प्रा. वि. बरवा)	१२	३७,२००।००	३०,०००।००	७,२००।००	३७,२००।००	३७,२००।००	६ सेट	१००
२८	विधुतीकरण विस्तार (विश्वम्भरपुर गाउँ)	१२	५०,०००।००	४०,०००।००	१०,०००।००	५०,०००।००	५०,०००।००	१५०	१००
२९	ईनारको ढकन निर्माण (कोदहवा र बिरपुर गाउँमा)	१३	३७,०१०।५६	३०,०००।००	७,०१०।५६	३७,०१०।५६	३७,०१०।५६	२ गोटा	१००
३०	सडक इन्डा सोलिङ तथा पि. सि. सि. (मालपारा मैनुलाहा नाउँको घर देखि पुर्वसोमई कठारको घर सम्म)	१३	१२५,०९१।१७	९७,०००।००	२८,०९१।१७	१२५,०९१।१७	१२२,१४७।५३	३४ मी.	१००
३१	सडक ईन्डा सोलिङ (गोपालपुर राम प्रसाद कोठारको घर देखि हुलाकी सडक सम्म)	१४	७२,७२७।२=	६०,०००।००	१२,७२७।२=	७२,७२७।२=	७२,७२७।२=	१९ मी.	१००
३२	सडक ईन्डा सोलिङ (लौसा शिव प्रसाद चमारको घर देखि विश्राम कोरीको घर सम्म)	१४	७३,२१५।१३	६०,०००।००	१३,२१५।१३	७३,२१५।१३	७३,२१५।१३	२५ मी.	१००
३३	सडक मर्मत तथा ग्रेभल (शिवपुरा गाउँको मुल सडकमा)	१५	७२,=५।३४	६०,०००।००	१२,=५।३४	७२,=५।३४	७२,=५।३४	=७ मीटर	१००
३४	सडक मर्मत तथा ग्रेभल (गोटिहवा अमृतलालको घर देखि कृतराजका घर सम्म)	१५	७२,२७२।६४	६०,०००।००	१२,=५।३४	७२,=५।३४	७२,२७२।६४	६० मीटर	१००
३५	सडक मर्मत तथा ग्रेभल (दलदलाहा गाउँको मेन रोड देखि पुर्व सिचाई कैमल सम्म)	१५	७४,६४९।९६	६०,०००।००	१४,६४९।९६	७४,६४९।९६	७३,३२१।४१	२५= मीटर	१००

भौतिक प्रगति

३६	सडक ईटा सालङ्ग (कापयवा गाडको मुल सडकमा)	१६	१,२५,१०३।४६	१००,०००।००	२५,१०३।४६	१२५,१०३।४६	१२५,१०३।४६	३० मीटर	१००
३७	विध्यालय कक्षा कोठा मर्मत तथा रंगरोगन (श्री धर्मभक्त नि. मा. वि. बभनी)	१६	१,२४,२२४।१४	१००,०००।००	२४,२२४।१४	१२४,२२४।१४	१२४,२२४।१४	१ वटा	१००
३८	करबलाको जग्गा संरक्षण गर्ने काम (श्रीरामपुर)	१६	२५,०००।००	२०,०००।००	५,०००।००	२५,०००।००	२०,०००।००	५० मीटर	५० मी
३९	सडक मर्मत गर्ने काम ।(सिचाई नहरको पुर्वडिल संगै जोडी कृषि सडक निर्माण)	१७	७२,५५३।०=	६०,०००।००	१२,५५३।०=	७२,५५३।०=	७२,५५३।०=	१५० मी.	१००
४०	सडक मर्मत गर्ने काम ।(गोवरी मुरली होटल देखि सेमरी गाडको सिमाना सम्म)	१७	७५,३६०।४=	६०,०००।००	१५,३६०।४=	७५,३६०।४=	७५,३६०।४=	१०५	१००
४१	सडक ईटा सोड्रि (गोवरी गाडको लालमन यादवको घर देखि अम्बीका प्रसाद यादवको घर सम्म)	१=	१२५,०२१।२४	१००,०००।००	२५,०२१।२४	१२५,०२१।२४	१२५,०२१।२४	३२ मी.	१००
४२	करबलाको जग्गा संरक्षण गर्ने काम (दधौला गाडको)	१=	२५,०००।००	२०,०००।००	५,०००।००	२५,०००।००	२०,०००।००	५० मीटर	१००
४३	विध्यालय कम्पाउण्डवाल तथा गेट निर्माण (जनता प्रा. वि. बर्मेली)	१९	१००,०००।००	=०,०००।००	२०,०००।००	१००,०००।००	१००,०००।००	१ गौटा	५०
४४	सडक ईटा सोलिड गर्ने काम । (रामापुर गाडमा मायाराम कुर्मीको घर देखि लक्ष्मण कोरीको घर सम्म)	१९	१२५,०२१।२४	१००,०००।००	२५,०२१।२४	१२५,०२१।२४	१२५,०२१।२४	३२ मी	१००
४५	जेष्ठ नागरीक पार्क निर्माण गर्नको लागि माटो पट्टान (सागरटोल)	५	१२४,९७९।४०	१००,०००।००	२४,९७९।४०	१२४,९७९।४०	१००,०००।००	१ वटा	१००
४६	फुटपाथ तथा पाकिङ्ग निर्माण (जिल्ला प्रशासन का. अगाडि)	३	३७०,१=९।६४	३६१,२०३।=२	=,९=५।=२	३७०,१=९।६४	३६१,२०३।=२	१ वटा	१००
४७	स्लैब तथा पि. सि. सि.	५	४९,४,=९.४।=०	४९,४,=९.४।=०	(४९,४,=९.४।=०	४९,४,=९.४।=०	१ वटा	१००
४८	पार्क निर्माण गर्ने काम ।	२	४७२,२३७।९५	४६१,१२०।२४	११,११७।७१	४७२,२३७।९५	४६१,१२०।२४	१ वटा	१००
४९	पार्क निर्माण कार्यालय हाता भित्र	५	४५१,०१९।९१	४५१,०१९।९१		४५१,०१९।९१	४५१,०१९।९१	१ वटा	१००

भौतिक प्रगति

आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पुर्वाधार तर्फ

क्र. सं.	योजनाको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान	श्रोत			मूल्याङ्कन	भौतिक लक्ष	भौतिक प्रगती %
				नगरपालिका बाट	उपभोक्ता समिति बाट	जम्मा			
१	बक्की नाली निर्माण (नयाटोल अन्तरगत रहेको मुल गडाहा देखि पुरानो भुमीसुधार कार्यालय अगाडी कसडेन सम्म)	१	४००,०००।००	४००,०००।००	१००,०००।००	४००,०००।००	४००,०००।००	७१ मी.	१००
२	सडक पि. सि. सि. तथा नाली निर्माण (रामजानकी मन्दिरको चारैतर्फ र बलराम कसोधन कसोधनको घर हुदै शौकीलाल कलवारको घर सम्म)	२	४००,०७६।२९	२७५,०००।००	६५,०७६।००	३४०,०७६।००	३४३,७५।००	६० मीटर	१००
३	सडक पि. सि. सि. गर्ने काम (विध्या निवास त्रिपाठीको घर देखि गौडी चौक हुदै पुर्व राजेश सिंहको घर सम्म)	४	४००,३९१।२४	३३३,०००।००	१३७,३९१।२४	४००,३९१।२४	४२९,४५१।३९	१२० मीटर	१००
४	सडक निर्माण गर्ने काम ।हरदेव कोहारको घर देखि जमुवार खोला सम्म)	५	४०२,७९।२५	४००,०००।००	१०२,७९।२५	४०२,७९।२५	४०२,७९।२५	५५ मी.	१००
५	कलभट्ट तथा सडक निर्माण । (लम्तिया गाउँको दक्षिण बरहथी रेहार सम्म)	६	४००,२६९।७३	४००,०००।००	१००,२६९।७३	४००,२६९।७३	४०२,४७५।२९	१ वटा	१००
६	सडक ईट्टा सोलिङ्ग र नाली निर्माण (रमतलहा गाउँको मुल सडक देखि पुर्व जाने सडक र सगमाथा बाल विकास भवनको अधुरो कार्य पुरा गर्ने)	७	४००,९४२।०९	४००,०००।००	१००,९४२।०९	४००,९४२।०९	४००,९४२।४९	७३ मी.	१००
७	अधुरो सडक पि. सि. सि. गर्ने (सेमरहवा मुल सडक देखि कुवान हुदै धर्मशाला सम्म)	८	४००,००९।००	४००,०००।००	१००,००९।००	४००,००९।००	४००,००९।००	९३ मी	१००
८	सडक ईट्टा सोलिङ्ग गर्ने काम (महु सावित्री श्रीवास्तवको देखि कालि मन्दिर सम्म)	९	४०९,०२६।३९	४००,०००।००	१०९,०२६।३९	४०९,०२६।३९	४००,९०३।३२	१२२ मीटर	१००

भौतिक प्रगति

९	सडक पि. सि. सि. (दुलो सडका सुरेश कुर्मीको घर देखि समय प्रसाद शुक्लको घर सम्म र हकिक्को घर देखि कघर सम्म)	१०	५००,०००।००	५००,०००।००	१००,०००।००	५००,०००।००	५०३,=२२।९१	१७१ मीटर	१००
१०	भवन मर्मत तथा रंगरोगन गर्ने काम (श्री प्रा. बि. सानो बरगढवा)	११	५०३,७२९।६५	५००,०००।००	१०३,७२९।६५	५०३,७२९।६५	५००,९=३।७७	१ वटा	=५
११	बाल विकास भवन निर्माण (औरहिया गाउँमा)	१२	५००,२६९।३९	५००,०००।००	१००,२६९।३९	५००,२६९।३९	५००,२५१।=३	१ वटा	=५
१२	अधुरो सडक ईँडा सोलिङ्ग तथा नाली निर्माण (कोदहवा गाउँमा)	१३	५००,०००।००	५००,०००।००	१००,०००।००	५००,०००।००	५००,०००।००	९३ मी.	१००
१३	सडक ईँडा सोलिङ्ग गर्ने काम (भगस कोरीको घर देखि खलिहान सम्म र बडहरको घर देखि भगस च्मारको घर सम्म)	१४	५००,२३२।५=	५००,०००।००	१००,२३२।५=	५००,२३२।५=	५००,२३२।५=	१२७ मी.	१००
१४	सडक मर्मत गर्ने काम (दलदलहा गाउँ देखि गोटिहवा जाने सडक)	१५	५,३६,६६०।३६	५००,०००।००	१३६,६६०।३६	५३६,६६०।३६	५१९,५०७।३६	६७५ मीटर	१००
१५	सडक ईँडा सोलिङ्ग गर्ने काम (वभनी नन्दलालको घर देखि पुल सम्म)	१६	५,०१,९६६।२५	५००,०००।००	१,०१,९६६।२५	१०१,९६६।२५	५९९,=३२।५५	१३३ मीटर	१००
१६	सडक निर्माण तथा ग्रेभल गर्ने काम (पिच सडक देखि पश्चिम विध्यालय सम्म)	१=	५०१,३५६।०५	५००,०००।००	१०१,३५६।०५	५०१,३५६।०५	५०१,३५६।०५	११५ मी.	१००
१७	सडक कालो पत्रे गर्ने काम (जनता प्रा. बि. राजकुलो देखि सिद्धिपुर हुँदै १९ को सिमाना सम्म)	१९	६=७,५०९।०५	५५०,०००।००	१३७,५०९।०५	६=७,५०९।०५	६=७,५०९।००	१७१ मी.	१००

भौतिक प्रगति

सडक बोर्ड नेपाल कार्यक्रम तर्फ

२०७३ आषढ मसान्त सम्मको प्रगती

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	बडा नं.	लागत अनुमान	कबोल अंक	खर्च	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति
१	सडक कालोपत्रे समेत गर्ने काम (तौलिहवा मुल सडक देखि पश्चिम सिकोटवा मालपारा हुदै विजगौरी पुल सम्म)	२, १० र १२	२,५००,२२६।६२	१,३५६,५५३।७०	१,३२५,२१८।८०	१००० मी.	१००
२	सडक कालोपत्रे समेत गर्ने काम (कृषि विकास बैंक देखि ५ तं. जाने पिच सडक सम्म र दुर्गा मन्दिर देखि वन कार्यालय जाने सडक)	३, ४ र ५	२,५०१,५८१।०३	१,४२१,९५७।४४	१,४१०,६८१।२७	१००५ मी.	१००
३	सडक कालोपत्रे समेत गर्ने काम (कृषि विकास कार्यालय देखि सुखरामपुर गाउँ सम्म)	३, ११	२,४१२,९६७।००	१,३२६,३३९।४४	१,०५४,०६४।००	९२० मी.	१००
४	सडक कालोपत्रे समेत तथा रि ग्रेभल गर्ने काम (क्याम्पस गेट देखि बृद्ध मूर्ति हुदै जमोहरा सम्म)	१०, १२	१,००७,३६१।००	५९०,१४२।५०	५८४,२१५।०९	२३५ मी. पिच र २९५ ग्रेभल	१००

भौतिक प्रगति

जगोडाकोष कार्यक्रम तर्फ

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	बडा नं.	लागत अनुमान	कबोल अंक	खर्च	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति
१	सडक ईट्टा सोलिङ्ग, पि. सि. सि. तथा पक्की नाली निर्माण (मुल सडक देखि पश्चिम रामकुमार ब्रमाको घर हुदै त्रिवेणी कडारको घर सम्म र पुन्य पन्थीको घर हुदै मोतिलाल पौडेलको घर सम्म)	२	४८,९२,४०१।५५	४८,६०,२१८।७२	१०१२१८१।६८	४४० मी. पि. सि. सि. र १०० मी. नाली	१००
२	सडक कालो पत्रे गत काम (हुलाकी सडक देखि नहर बाटो हुदै भगवानदास मा. वि. तथा गणेश गुन्ताको घर सम्म)	५	४८,९२,४२३।६६	४८,८२,२३२।८	२०३३१९७।७०	८८५ मी.	१००
३	सडक कालो पत्रे गर्ने काम । (सुखरामपुर पिच सडक देखि लक्ष्मीनगर नहर सम्म अश्रुरा पिच सडक)	११	४८,९१,७९५।८३	४८,९१,१६५।४५	३२४९९६७।०१	१७० मी. पिच र २४५ मी पि. सि. सि.	१००
४	सडक पि. सि. सि. गर्ने काम (हुलाकी सडक देखि त्रिरपुर हुदै मालपारा चौक सम्म र मालपारा गाउँ भित्र)	१३	४८,९२,६५२।५५	४८,६१,०६१।१२	३३७४८३७।०९	३०० मी पि.सि.सि. र २६७ मी. नाली	१००
५	सिंचाई बांध निर्माण तथा फाटक निर्माण गर्ने काम (श्रीरामपुर बांध)	१६	४८,६३,२२२।०८	४८,४६,०३३।३७	४००००००	१ बटा	१००
६	सडक कालो पत्रे गर्ने काम (गाबरी चौक देखि पश्चिम तिलौरा हुदै तिलौराकोट पिच सडक सम्म)	१८	४८,९२,६९५।९६	४८,९०,०३५।९६	१३०४१६६।९०	२५० मी. पिच र ६११ मी. नाली	१००

भौतिक प्रगति

जि बि. तर्फका योजनाहरु

स.स.	योजनाको नाम	बडा नं.	सागत अनुमान	श्रोत			सुलयाङ्कन	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती %
				नगरपालिकाबाट	उपभोक्ता समितिबाट	जम्मा			
१	बाल मन्दिर पोखरी आउगढीवाल निर्माण	५	५५०,७४९/०९	२९९,०००/००	२५१,७४९/०९	५५०,७४९/०९	५५०,७४९/०९	१४ मी.	१००
२	गजूर पूनः निर्माण, बाल मन्दिरमा	५	२३२,०००/००	१९५,०००/००	३७,०००/००	२३२,०००/००	२३२,०००/००	१ बटा	१००
३	भवन मर्मत, प्रा.वि. सुखरामपुर	११	१७५,६७७/२८	१४५,५००/००	२९,१७७/२८	१७५,६७७/२८	१७५,६७७/२८	१ बटा	१००
४	अधुरो भवन, मायादेवी महिला सहकारी, तिलौराकोट	१८	२३३,६५०/५०	१९५,०००/००	३८,६५०/५०	२३३,६५०/५०	२३३,६५०/५०	१ बटा	१००
५	खानेपानी धारा जडान	१७, १८ र १९	२३७,०४९/६३	१९५,०००/००	४२,०४९/६३	२३७,०४९/६३	२३७,०४९/६३	१० धान	१००
६	नाली निर्माण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण पुर्वको सडकमा	५	२३२,०००/००	१९५,०००/००	३७,०००/००	२३२,०००/००	२३२,०००/००	६३ मी.	१००
७	ईदगाह निर्माण, मालपारा	१३	२०३,७००/००	१६९,७५०/००	३३,९५०/००	२०३,७००/००	२०३,७००/००	१ बटा	१००
८	मदरसा बरिब नवान अहले सुन्नत, सेमरी	१७	२३२,०४९/०३	१९५,०००/००	३७,०४९/०३	२३२,०४९/०३	२३२,०४९/०३	१ बटा	१००

भौतिक प्रगति

९	सडक पि.सि.सी., महुवरिया सन्तराम पाण्डेयको घरको पुर्व काली मन्दिर सम्म	६	२९९,०२५१२	२४२,५००००	४८,५२५१२	२९९,०२५१२	२९९,०२५१२	५० मी.	१००
१०	सडक मर्मत तथा ग्रेभल, आंखा अस्पताल देखि महिला जाने बाटो	४	१७४,६००००	१४५,५००००	२९,१००००	१७४,६००००	१७४,६००००	२०० मी.	१००
११	सडक मर्मत तथा ग्रेभल, सेमरी गाड देखि लक्ष्मीनगर सम्म	१७	२,३६४,०००००	१,९७०,०००००	३९४,०००००	२,३६४,०००००	२,३६४,०००००	१६५० मी.	१००
१२	अधुरो सडक कालोपत्रे, लम्तीया देखि महुवरिया जाने सडक	६	२,००९,४००००	१,६७४,५००००	३३४,९००००	२,००९,४००००	२,००९,४००००	४३० मी.	१००
१३	सडक पि.सि.सी., बनारसी कसौधनको घर देखि उत्तर गंगा कसौधनको घरसम्म	२/३	=२७,४००००	६=९,५००००	१३७,९००००	=२७,४००००	=२७,४००००	=८ मी.	१००
१४	राधा कृष्ण मन्दिरको थप कार्य, आनन्दवाग	४	२३२,=००००	१९४,०००००	३८,=००००	२३२,=००००	२३२,=००००	१ कटा	१००
१५	सडक कालोपत्रे, बरगदवा महुवरिया जाने बाटो देखि सिचाई नहर सम्म	५	=२७,४००००	६=९,५००००	१३७,९००००	=२७,४००००	=२७,४००००	१७८ मी.	१००
१६	सडक मर्मत तथा ग्रेभल, कोदीहा गाडमा हूलाकी सडक देखि सोमई यादवको घर सम्म	१३	११८,९९११०	९८,५००००	२०,४९११०	११८,९९११०	११८,९९११०	१५० मी.	१००
१७	सडक ईंटा सोलिङ्ग, बीरपुर कमला नाउको घर देखि सुदामा चौधरीको घर हुँदै सोमई यादवको घर सम्म	१३	११८,७७१=४	९८,५००००	२०,२७१=४	११८,७७१=४	११८,७७१=४	२८ मी.	१००
१८	सडक ईंटा सोलिङ्ग, गोटीहवा गाडको मुल सडक देखि दक्षिण महतिनाडिहवाको नहर सम्म	१५	११८,७७१=४	९८,५००००	२०,२७१=४	११८,७७१=४	११८,७७१=४	२८ मी	१००
१९	सडक मर्मत तथा ग्रेभल, डेरवा पिच सडक देखि चन्द्र यादवको घर सम्म	१२	=२,७७९/७९	६८,९५०००	१३,८२९/७९	=२,७७९/७९	=२,७७९/७९	९२ मी.	१००
२०	सडक ईंटा सोलिङ्ग, औरहिया रामचन्द्र लालको घर देखि मुल सडक सम्म	१२	३८,५=६२	२९,५५०००	९,०३=६२	३८,५=६२	३८,५=६२	१७ मी.	१००
२१	फर्निचर निर्माण, भगवानदास मा.वि. ठूलो बरगदवा	५	१०६,१७७००	९८,५००००	७६,७७००	१०६,१७७००	१०६,१७७००	१० सेट	१००
२२	कोठाको फर्स निर्माण, राधाचन्द्र प्रा.वि. जमोहरा	१२	४४,९००/७०	३४,४७५/००	१०,४२५/७०	४४,९००/७०	४४,९००/७०	१ कटा	१००

भौतिक प्रगति

२३	सडक मर्मत, गोपालपुर गाउँको मुल सडक	१४	४७,२=०१००	३९,४००१००	७,=०१००	४७,२=०१००	४७,२=०१००	५३ मी.	१००
२४	ईनारको ढक्कन र चौतारी निर्माण, सुखरामपुर गाउँको दक्षिणमा रहेको ईनार	११	५९,१००१००	४९,२५०१००	९,=५०१००	५९,१००१००	५९,१००१००	१ धान	१००
२५	सडक मर्मत तथा ग्रेभल, सिंचाई नहर देखि पश्चिम पिपरी सिंचाई नहर सम्म	१४	११६,४६५/३=	९७,०००१००	१९,४६५/३=	११६,४६५/३=	११६,४६५/३=	१५५ मी.	१००
२६	कूलो तथा सडक मर्मत, तिलौरा गाउँ काली मन्दिर देखि पुरानो कूलो सम्म	१=	११६,४००/१=	९७,०००१००	१९,४००/१=	११६,४००/१=	११६,४००/१=	३=५ मी.	१००
२७	कूलो तथा सडक मर्मत, सुखरामपुर देखि जमुवार नदी सम्म	११	११७,३१५/५६	९७,०००१००	२०,३१५/५६	११७,३१५/५६	११७,३१५/५६	२४१ मी.	१००
२=	शिव मन्दिर मर्मत तथा व्यवस्थापन, ठूलो सडक	१०	११६,३४६/१७	९७,०००१००	१९,३४६/१७	११६,३४६/१७	११६,३४६/१७	१ वटा	१००
२९	अधुरो नाली निर्माण, आंखा अस्पताल देखि दक्षिण तर्फ सिद्धार्थ टोलमा	४	१७४,६००१००	१४५,५००१००	२९,१००१००	१७४,६००१००	१७४,६००१००	१ वटा	१००
३०	शिव मन्दिरको रंगरोगन तथा प्लाष्टर, सुखरामपुर	११	=७,३००१००	७,७५०१००	१४,५५०१००	=७,३००१००	=७,३००१००	१ वटा	१००
३१	भूयाल ढोका निर्माण, सगरमाथा बाल विकास केन्द्र, रमतलहा	७	५=,=४५/४४	४=,५००१००	१०,३४५/४४	५=,=४५/४४	५=,=४५/४४	१ वटा	१००
३२	सडक कालोपत्रे, सशस्त्र प्रहरी विट हुँदै गएको राजकुला देखि उत्तरको सडकको जगादिशपुर जाने सडक	१९	५=२,०००१००	४=५,०००१००	९७,०००१००	५=२,०००१००	५=२,०००१००	१२५ मी.	१००
३३	कूलो मर्मत, सिंचाई नहर देखि पुर्व	=	११६,४००१००	९७,०००१००	१९,४००१००	११६,४००१००	११६,४००१००	२५० मी.	१००
३४	सडक मर्मत तथा ग्रेभल, तौलिहवा चार नम्बर जाने बाटो नहरको मुल देखि बुद्ध ज्योती स्कुल अगाडी सम्म	४	२३२,९५४/२७	१९४,०००१००	३=,९५४/२७	२३२,९५४/२७	२३२,९५४/२७	२६९ मी.	१००
३५	सडक मर्मत तथा ग्रेभल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण देखि घुरेन्द्र श्रीवास्तवको घर हुँदै पिच रोड सम्म	५	२९१,३३५/१४	२४२,५००१००	४=,=३५/१४	२९१,३३५/१४	२९१,३३५/१४	=१ मी.	१००

भौतिक प्रगति

३४	सडक मर्मत तथा ग्रेभल, तौलिहवा चार नम्बर जाने बाटो नहरको पुल देखि बूढ ज्योती खुल अगाडी सम्म	४	२३२,९५४२७	१९४,०००१००	३८,९५४२७	२३२,९५४२७	२३२,९५४२७	२३२,९५४२७	२३२,९५४२७	१००
३५	सडक मर्मत तथा ग्रेभल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण देखि घुरेन्द्र श्रीवास्तवको घर हुँदै पिच रोड सम्म	५	२९९,३३५१४	२४२,५००१००	५६,८३५१४	२९९,३३५१४	२९९,३३५१४	२९९,३३५१४	२९९,३३५१४	१००
३६	जेष्ठ नागरिक पार्क निर्माण, सागरटोल	५	११६,४००१००	९७,०००१००	१९,४००१००	११६,४००१००	११६,४००१००	११६,४००१००	११६,४००१००	१००
३७	साईकल स्टेण्ड बूढ पच उच्च मा.वि. तौलिहवा	५	६३,०००१००	६९,०००१००	६६,०००१००	६३,०००१००	६३,०००१००	६३,०००१००	६३,०००१००	१००
३८	ईटा सोलिड र सडक मर्मत, गोटीहवा देखि महतिया गाडं	१५	१७४,६००१००	१४५,५००१००	२९,१००१००	१७४,६००१००	१७४,६००१००	१७४,६००१००	१७४,६००१००	१००
३९	नारायण मन्दिरको गुमज निर्माण	३	८५७०१२५	७२७५०१००	१२९५०१२५	८५७०१२५	८५७०१२५	८५७०१२५	८५७०१२५	१००
४०	भण्डार खानाको छाना निर्माण (दत्तमैतिया ब्राजा मन्दिरमा)	१२	९३५२७९३	४८५००१००	४५०२७९३	९३५२७९३	९३५२७९३	९३५२७९३	९३५२७९३	१००

सामाजिक क्षेत्रतर्फको प्रमुख प्रगति

- बिपन्न महिलाहरूका लागि सिलाई काटाई तालिम गरिएको साथै सिलाई मेसिन वितरण गरिएको ।
- बिपन्न महिला तथा पिछडिएका वर्गहरूलाई आधारभुत कम्प्युटर तालिम दिईएको ।
- मातृशिशु स्याहार तालिम, बाख्रा पालन तथा पशुपालन तालिम, अगरबत्ती बनाउने तालिमले आर्थिक शिपको विकास भएको ।
- प्रजनन स्वास्थ्य तालिम, पाठेघरको समस्या तथा रोकथाम सम्बन्धी तालिम, ब्युटी पार्लर तालिम भएको ।
- सरसफाई सचेतना तालिम तथा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोसणा वडा न. ५ लाइ गरिएको ।
- महिला तथा बालबालिकाहरूका लागि २ दिने आखा शिबिर संचालन गरिएको ।
- बिद्यालयहरूमा प्याड तथा इस्टबिन वितरण, हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता र साउन्ड बक्स वितरण ।
- बेमौसमी तरकारी तथा च्याउ खेति तालिम, हाउस वायरिंग तालिम, आपंगा मैत्री कार्यक्रम, पर्यटन गाइड तालिम, बैदेशिक रोजगार तालिम, मोटर ड्राइभिग तालिम, मुर्ति बनाउने तालिम, आई. पी.एम तालिम, जोडी तालिम, जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरू, मुस्लिम लक्षित कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको ।

सञ्चालित आयोजनाको विवरण

योजना	सङ्ख्या
१ लाख भन्दा कम	४७
१-५ लाख सम्म	१७
५-१० लाख सम्म	०
१० लाख भन्दा माथि	१०
कुल	७४

सामाजिक सुरक्षा वितरणको विवरण (अख्तियारी प्राप्त गर्ने न.पा.हरुले मात्र
भर्नुपर्ने)

विवरण	आब ०७२/७३ मा भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या	लगत कट्टा गरिएको संख्या	खर्च रकम (रु. हजारमा)	फ्रिज रकम (रु. हजारमा)	आ.ब ०७३-७४ मा भत्ता वितरण गर्नु पर्ने संख्या
औषधि उपचार वृद्ध-वृद्धा	१००५	५४	९५६५.५		१०८८
बृद्ध भत्ता	३९०	११	१६९२.५		३७३
अपाङ्ग भत्ता	८२	२	७८३.२		१०२
एकल महिला भत्ता	८१५	१५	४२२५		८२४
लोपोन्मुख भत्ता	६६	-	७५६		६७
बाल संरक्षण अनुदान	४३६	१२०	१६२३.८		३८५
कुल	२८६९	२०२	१८६४६		२८३९

बेरुजु फछ्यौटको स्थिति

क) बेरुजुको विवरण (रकम रु. हजारमा)															
विवरण	बेरुजु रकम									फछ्यौट रकम				फछ्यौट प्रगति प्रतिशत	
	अनियमित			पेशकी			असुल उपर			कुल बेरुजु	अनियमित	पेशकी	असुल उपर		कुल
	आ.ब. ७०/७१	आ.ब. ७१/७२	कूल	आ.ब. ७०/७१	आ.ब. ७१/७२	कूल	आ.ब. ७०/७१	आ.ब. ७१/७२	कूल						
केन्द्रीय अनुदान तर्फ															
आन्तरीक श्रोत तर्फ	०	०	०	९८	२०४	३०२	७५	०	७५	०	०	२०७	६७	२७४	७२.६७
कुल	०	०	०	९८	२०४	३०२	७५	०	७५	०	०	२०७	६७	२७४	७२.६७

गुनासो फछ्यौटको अवस्था

विवरण	संख्या	कारवाही संख्या	सम्बोधन (फछ्यौट)
अ.दु.अ.आ उजुरीहरु	३	३	१
हेलो सरकारको उजुरीहरु	१	१	१
सतर्कता केन्द्रको उजुरीहरु			
अन्य गुनासो / उजुरीहरु	१६	१६	१६
कुल	२०	२०	१८

त्रिवर्षिय योजनाको प्रगति

विवरण	स्थिति
क्षमता विकास योजना तयार	नभएको
आवधिक योजना तयार	भएको
बालमैत्री स्थानीय शासनको संरचना अपनाएको	भएको
वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको संरचना अपनाएको	भएको
एकीकृत सम्पत्ती कर लागू	भएको
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अपनाएको	भएको
लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण अपनाएको	भएको
Sanitary landfill site निर्माण	नभएको
राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिताको कार्यान्वयन	भएको

त्रिवर्षिय योजनाको प्रगति

विवरण	जम्मा संख्या
मृत्यु दर्ता	२४०
जन्म दर्ता	११९२
विवाह दर्ता	४६८
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	०
बसाई सराई दर्ता	२७
कुल	१९२७

उत्तरदायित्वको विवरण

वित्तिय अनुशासन

विवरण	
Audit tracking system लागु भएको/नभएको	नभएको
लेखा software प्रयोग	भएको

सुशासन सम्बन्धी विवरण

विवरण	न.पा.
गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको	भएको
सार्वजनिक सुनुवाई गरेको (संख्या)	३
सार्वजनिक परिक्षण गरेको (संख्या)	७४
सार्वजनिक परिक्षण गरेको आयोजानाको संख्या	७४

कार्यसम्पादन सम्झौता (न.पा.)

विवरण	प्रतिशत	पुष्ट्याई
कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार न.पा.द्वारा सम्पादित कार्यको प्रगति प्रतिशत (स्वमूल्यांकन)	५०	बिगत आ. ब. हरुमा सम्झौता अनुरूप क्रियाकालाप हरु अगी नबढ्दा चालु आ.ब.मा मात्रै प्रगति देखाउन नसकिने

आगामी आ.व.को प्रमुख नीतिहरू

- अत्यावश्यक, अनिवार्य र ठूला परियोजना संचालनका लागि स्रोतको खोजी गर्ने ।
- त्रिवर्षिय अन्तरिम योजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र आवधिक नगर विकास योजनाका लक्ष्यलाई परिपूर्ति हुने योजनालाई प्राथमिकता दिने ।
- कार्यालयको प्रशासनिक ढाँचालाई शिर्जनशील बनाउन पेशकी बेरुजू फरफारक गर्ने, लिलाम विक्री, मिन्हा र राजश्व तथा ऋण असुलीमा प्रभावकारी कदम चालिने ।
- सूशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता वृद्धि गर्न सार्वजनिक परिक्षण, सूनूवाई र रेडियो कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- स्थानीय निकायका कर्मचारीको क्षमता विकास कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने ।

क्रमशः

आगामी आ.व.को प्रमुख नीतिहरू क्रमशः

- शहरी वडामा अनिवार्य लागत सहभागिता र ग्रामीण वडामा ऐच्छिक र श्रम सहभागितामा जोड दिइने छ ।
- वालवालिका, दलित, जनजाति, पिछडावर्ग, महिला र अपाङ्ग सम्मिलित परियोजना कार्यन्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ ।
- खुला दिशामुक्त अभियानलाई सफल बनाउन नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी, न.पा.संग समन्वय गरी काम गर्ने संघसंस्थाका पदाधिकारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका पदाधिकारी सबैले अनिवार्य रुपमा शौचालय बनाउनु पर्ने अन्यथा न.पा.का क्रियाकलापमा समावेश नगराइने कर्मचारीको हकमा तलब रोक्का राख्ने तथा सेवाग्राहीहरूलाई न.पा बाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरू रोक्का गर्ने नीति अख्तियार गरिने छ ।

आगामी आ.व.को प्रमुख नीतिहरू क्रमशः

- रोजगारी सिर्जनामा जोड दिदैँ आयोजना संचालन गर्दा उपभोक्ता समिति एवं टोल विकास संस्थालाई प्राथमिकता दिने ।
- शहरी वडामा अनिवार्य लागत सहभागिता र ग्रामीण वडामा ऐच्छिक र श्रम सहभागितामा जोड दिइने छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन

विवरण	केन्द्रतर्फ		कोषतर्फ		जम्मा	
	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति
अधिकृतस्तर						
सहायकस्तर			१७	१६	१७	१६
सहयोगीस्तर			३२	३२	३२	३२
जम्मा			४९	४८	४९	४८

प्रमुख समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास

क्र.स.	प्रमुख समस्या	समस्या समाधानार्थ चालिएका प्रयास	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	जिम्मेवार निकाय
१	अविरल वर्षाको कारण बस्ति डुबानमा परेको	तत्काल राहत सामग्री वितरण गरिएको		
२	आगलागि नियन्त्रण	पुरानो एउटा दमकलले पुरा जिल्ला भरी सेवा प्रदान गरिरहेको	अन्य नगरपालिकाहरूमा पनि दमकल हुनु पर्ने	
३	नाली व्यवस्थापन	डोजर तथा जनशक्तिको प्रयोग गरि समाधान गरिएको	बृहत गुरु योजना निर्माण गर्नुपर्ने	

सि.नं.	अपेक्षा
१	स्थानिय सेवाको गठन तथा स्थानीय निकायका कर्मचारीको सरुवा तथा अन्य व्यवस्थापन
२	स्थानीय निकायमा प्रदान गरिने अनुदानमा वृद्धि
३	आफ्नै श्रोतबाट दमकल खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको
४	मन्त्रालयले न. पा. बाट सम्पादन गरिने क्रियाकलाप हरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने
५	कार्यसम्पादन सम्झौतालाई तोकिएको समय भित्र सम्पन्न गर्न सकिने गरि बस्तुनिष्ठ बनाउन, सम्झौता गरिसकेपछि तोकिएको समय सम्म अनिवार्य रुपमा कार्य गराउने, छिटो, छिटो सरुवा नगर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड तथा पुरस्कार एवं कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई आबद्ध गर्ने

नतिजा



नतिजा



नतिजा



नतिजा



नतिजा



अ

नतिजा



नतिजा



धन्यवाद
